



下専協 現場勉強会

第 1 回

2015年1月16日 実施

工事概要

- 1) 工事件名 練馬区早宮三丁目付近外管渠補修工事
- 2) 工事場所 練馬区早宮三、四丁目
- 3) 発注者 東京都下水道局 西部第二下水道事務所
- 4) 現場視察日 平成27年1月16日
- 5) 工 期 契約締結の日の翌日80日間
自：平成26年 11月 4日
至：平成27年 3月 6日
- 6) 受注者名 松戸建設(株)
- 7) 現場責任者 松戸良太氏
- 8) 説明 本工事は、練馬区早宮三丁目付近外で実施した管路内調査の結果、施設に劣化や損傷等があることが判明し、維持管理に支障をきたしているため、補修を行うものである。
なお、本工事は一部深夜間施工とし、その他は昼間施工とする。
- 9) 工事概要 **【工事概要(構造物内容)】**
取付管及び汚水ます補修工(開削工法)
ます補修工 計 96箇所
取付管補修工 計 L=289.80m(94箇所)
取付管補修工(内面被覆工法<反転・形成工法>) 計 L=173.40m(58箇所)
- 10) 当日の作業内容 ます補修工および取付管補修工(開削) 2か所

広 報 編

施工会社
松戸建設㈱



作業帯両端のカラーコーンに「油断快適 下水道」のPRを設置。



作業車輛のドアに下水道局マスコットキャラクター、「アース君」のステッカー

安全管理編

施工会社
松戸建設㈱



バックホウ後方に注意喚起の表示。



先掘り担当であることが分かるようにチョッキを着用している。




重機誘導員のチョッキを着用。

安全管理編

施工会社
松戸建設㈱



色の異なるカラーコーンで他企業埋設物の位置を明示していた。

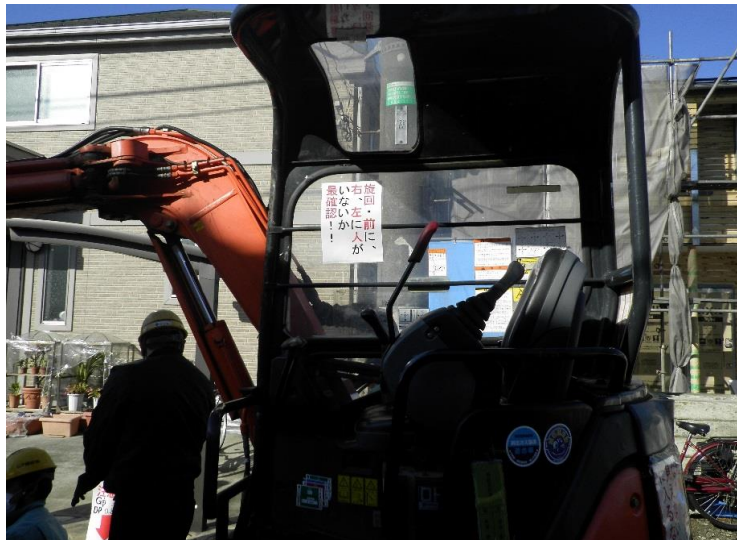

バックホウの運転席に、オペレーターに対して注意喚起の明示あり。




他企業埋設物損傷防止のため対策を工事看板裏に明示していた。

資機材編

施工会社
松戸建設㈱



掘削範囲周辺の養生
厚手のブルーシートを使用。

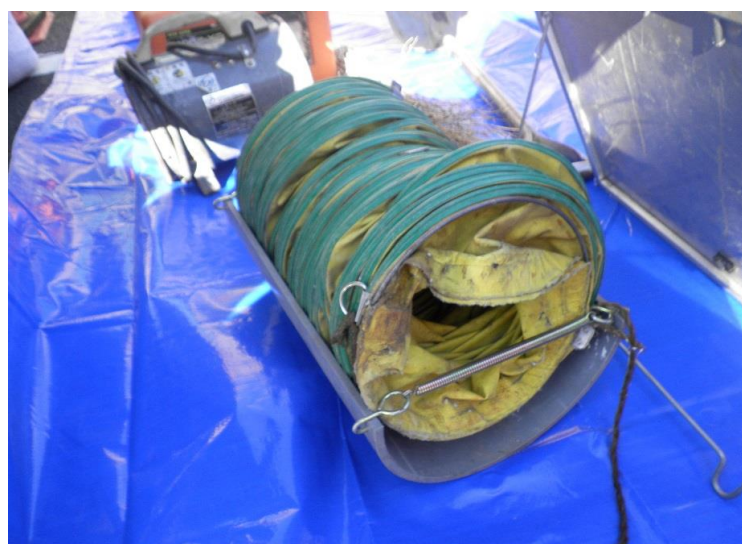

塩ビ管を半割にしたものに
送風機の蛇腹ダクトを収納
していた。



ポリタンクを小道具の収納に
流用していた。
