



下専協 現場勉強会

第 2 回

2015年2月12日 実施

工事概要

- 1) 工事件名 生活幹線道路整備（電線共同溝）工事
- 2) 工事場所 練馬区西大泉五丁目地内
- 3) 発注者 練馬区役所
- 4) 現場視察日 平成27年2月12日
- 5) 工 期 自：平成26年 11月12日
至：平成27年 3月16日
- 6) 受注者名 (株)ホープ
- 7) 現場責任者 荒井重雄氏
- 8) 説明 本工事は、練馬区西大泉五丁目地内の整備における電線類の地中化に伴い電線共同溝を敷設するため、本工事を施工する。
- 9) 工事概要 ダクトスリーブ設置工・プレキャストボックス設置工
(特殊部基礎)・プレキャストボックス工(特殊部)その他
- 10) 当日の工事内容 プレキャストボックス(特殊部)の設置工事




区発注の案件にて、練馬区アニメキャラクター「ねり丸」を区の承諾を得て、工事看板に使用。



お知らせを看板ではなく垂れ幕を使用。

資機材編

施工会社
㈱ホープ

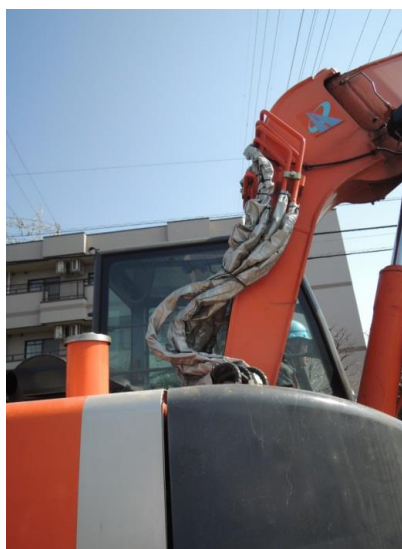

バックホウのホースに
防護カバーを装着していた。



バックホウ後方に回転灯、
モニターを装備していた。



バックホウ運転席に
後方確認用モニターを
装備していた。

資機材編

施工会社
㈱ホープ



ラチェットで伸縮する土留工事用ジャッキを使用。水圧式のように水圧ポンプ等を準備する手間がかからない。



工事看板の防護カバーが外れないように、プラスチックの留め具を使用していた。



仮設ガードレールの型枠にスパイラル鋼管を使用している。現場でコンクリートを流し込んで使用できる等利点がある。
